

**«ՀայՌ-Պապադապոս» ՓԲԸ  
2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ  
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ**

**ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔ**

**ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՎ**

ԵՐԵՎԱՆ 2006

## ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Սույն վերլուծական փեղեկանքը կազմվել է ի կախարումն Նայասարանի Նանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2006 թվականի փարեկան աշխատանքային ծրագրի 17-րդ կետի՝ «ՆայՌուսագազարդ» ՓԲԸ-ի 2005 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքների գնահատման նպատակով՝ լիցենզավորված գործունեության մոնիթորինգի և ներդրումային ծրագրերի վարչության ներդրումային ծրագրերի բաժնի կողմից:

Սույն վերլուծական փեղեկանքում օգտագործվել են «ՆայՌուսագազարդ» ՓԲԸ-ի կողմից փաստացի կատարված ներդրումների վերաբերյալ ՆՏ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացված հաշվետվություններում արտացոլված փվյալները: Պետք է նշենք, որ 2005 թվականին «ՆայՌուսագազարդ» ՓԲԸ-ի կողմից փաստացի կատարված ներդրումների վերաբերյալ հանձնաժողով ներկայացվող հաշվետվություններում հաշվի են առնվել ընկերության 2004 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքների, ինչպես նաև 2004 թվականին և 2005 թվականի առաջին եռամսյակի ընթացքում փաստացի կատարված ներդրումների մասին հանձնաժողով ներկայացված հաշվետվությունների ընտրանքային մոնիթորինգի արդյունքների մասին վերլուծական փեղեկանքներում հանձնաժողովի աշխատակազմի կողմից առաջադրված բոլոր դիտողություններն ու առաջարկությունները: Ընկերության կողմից ճշգրտվել և կրկին հանձնաժողով են ներկայացվել 2004 թվականին և 2005 թվականի առաջին եռամսյակի ընթացքում փաստացի կատարված ներդրումների վերաբերյալ հաշվետվությունները:

### «ՆայՌուսագազարդ» ՓԲԸ-ի 2005 թվականի ներդրումային ծրագիրը

«ՆայՌուսագազարդ» ՓԲԸ-ի 2005 թվականի փարեկան ներդրումային ծրագիրը հանդիսանում է ընկերության 2005-2007 թվականների եռամյա ներդրումային ծրագրի բաղկացուցիչ մասը: Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում նախատեսված էր փարբեր միջոցառումներ իրականացնել գազափոխադրման և գազաբաշխման համակարգերում՝ դրանց վերակառուցման, վերազինման, նոր բաժանորդների միացման և կորուստների նվազեցման նպատակով: Ներդրումներ էր նախատեսված իրականացնել նաև այդ համակարգերի շահագործման կազմակերպման և ընկերության բնականոն գործունեության ապահովման նպատակով՝ մեքենաների և մեխանիզմների, համակարգչային տեխնիկայի և փնտրասական գույքի ու գործիքների ձեռքբերման ուղղությամբ:

ՏՏ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը «ՆայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ի 2005-2007 թվականների ներդրումային ծրագրին համաձայնություն էր փոխել իր 2005 թվականի փետրվարի 9-ի № 12Ա որոշմամբ: Ներդրումային ծրագրով նախատեսված էր 2005-2007 թվականի ընթացքում իրականացնել 21 562,0 մլն դրամի ներդրումներ, որից 6 679,7 մլն դրամի ներդրումները՝ 2005 թվականի ընթացքում: Այնուհետև, համաձայն հանձնաժողովի 2005 թվականի հունիսի 10-ի № 72Ա որոշման՝ Արվյանի գազի ստորգետնյա պահեստարան-կայանի վերակառուցման և արդիականացման 11 721,9 մլն դրամ ներդրումների ընդհանուր ծավալ ունեցող ծրագրի իրականացումն սկսելու նպատակով, 2005 թվականի ներդրումների ծավալը ավելացել և կազմել է 8 673,2 մլն դրամ: Այսպիսով, ընկերության 2005 թվականի ներդրումային ծրագիրը բաղկացած է երկու հիմնական բաղկացուցիչներից՝

1. գազափոխադրման և գազաբաշխման համակարգերում ներդրումներ՝ 6 619,8 մլն դրամ,
2. Արվյանի գազի ստորգետնյա պահեստարան-կայանի վերակառուցում և արդիականացում՝ 2 053,4 մլն դրամ:

Վերը նշված բոլոր դրամային ծավալները, ինչպես նաև սույն վերլուծական փեղեկանքում ներկայացված բոլոր գումարները չեն ներառում ավելացված արժեքի հարկը:


Ներդրումային ծրագրի երկրորդ բաղկացուցիչ ուղղությամբ ընկերությունը 2005 թվականի ընթացքում իրականացրել է 5,6 մլն դրամի ներդրումներ, միևնույն ժամանակ 86,0 մլն դրամի անավարտ աշխատանքներ:

Գրաֆիկ 1-ում ներկայացված է ընկերության 2005 թվականի ներդրումային ծրագրի առաջին բաղադրիչի ներդրումների ծավալի բաշխումը հիմնական ուղղությունների միջև:

Ինչպես փեսնում ենք գրաֆիկական պատկերից, ներդրումային հիմնական գերակայությունը գազաբաշխման համակարգի ընդլայնումը և նոր բաժանորդների միացումն է. այն կազմում է 2005 թվականին նախատեսված ներդրումների ծավալի 73,1%-ը:

Գազափոխադրման և գազաբաշխման համակարգերի վերակառուցման և վերազինման նպատակով նախատեսվում է կառուցել նոր միջին և բարձր ճնշման գազատարներ, փոխարինել կամ վերափոխադրել դրանց վթարային հարվածները, կառուցել կամ վերականգնել առկա էլեկտրապաշտպանիչ կայանները, ինչպես նաև կառուցել նոր գազաբաշխիչ կայաններ, փեղադրել գծային փականներ, արդիականացնել հաշվառման համակարգը և այլն:

**ԳՐԱՆԻԿ 1**

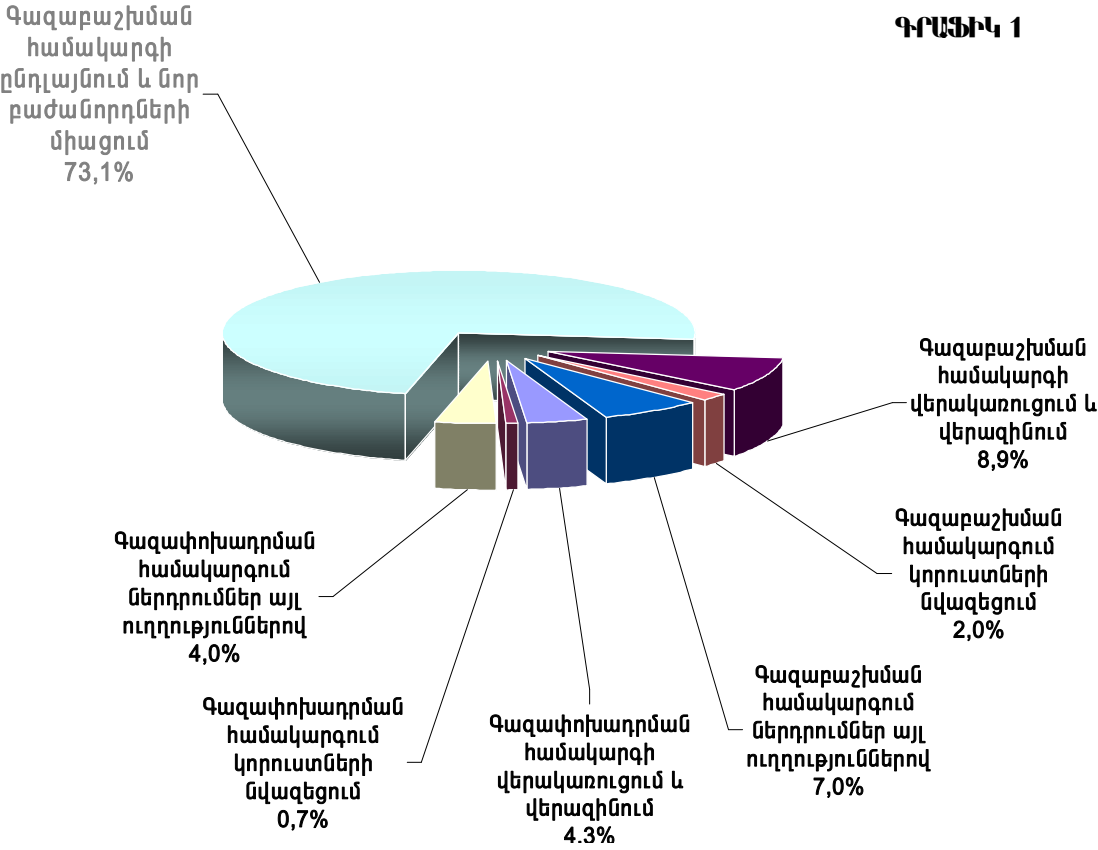

Ներդրումներ էր նախատեսվում իրականացնել այլ ուղղություններով ևս, մասնավորապես, շենքերի և շինությունների վերակառուցման, մեքենաների և մեխանիզմների ձեռքբերման, աշխատանքի պաշտպանության և անվտանգության փեխնիկայի ձեռքբերման, ինչպես նաև վթարային ծառայության և հրդեհային անվտանգության փեխնիկայի համալրման և կապի համակարգի բարելավման նպատակով:

## «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ի կողմից 2005 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքները

«ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ի 2005 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքների գնահատման նպատակով սույն վերլուծական փեղեկանքում դիտարկված է ընկերության կողմից 2005 թվականի ներդրումային ծրագրի շրջանակներում իրականացված ներդրումները և ըստ ուղղությունների ներկայացված է ներդրումային ծրագրի կատարման ցուցանիշների գնահատականը: Նարկ ենք համարում նշել, որ ներդրումային ծրագրի կատարման ցուցանիշները գնահատելիս ընկերության կողմից իրականացված ներդրումներ են համարվել 2005 թվականի ընթացքում լիցենզավորված գործունեության մեջ ներգրավված օգրագակար և օգրագործվող նոր ակտիվների արժեքը: Պետք է ի նկատի ունենալ, որ այդ ակտիվների կառուցման ծախսերը կարող են ամբողջությամբ իրականացված լինել ինչպես հաշվետու փարվա ընթացքում այնպես էլ մասնակիորեն դրան նախորդող ժամանակահատվածի ընթացքում և շահագործման հանձնված լինել հաշվետու փարում: Ուստի այդ ակտիվների արժեքը չի բնորոշում ընկերության կողմից փվյալ փարվա ընթացքում ներդրումների իրականացման նպատակով ներգրավված ֆինանսական միջոցների չափը: Մինևույն ժամանակ իրականացված ներդրումների ծավալում չի ներառվել անավարտ մնացած աշխատանքների կամ շահագործման չհանձնված ակտիվների արժեքը, քանի որ դրանք դեռևս չեն մասնակցում լիցենզավորված գործունեության իրականացմանը և ազդեցություն չեն կարող ունենալ ընկերության գործունեության ցուցանիշների վրա: Բացի նշվածը, սույն վերլուծական փեղեկանքում չեն դիտարկվել 2005 թվականի ներդրումային ծրագրի շրջանակներից դուրս իրականացված ներդրումները, քանի որ դրանք գնահատման առարկա չեն կարող հանդիսանալ ներդրումային ծրագրի կատարման ցուցանիշները դիտարկելիս: Այդ ներդրումների կառուցվածքում առկա են եղել երկու բաղադրիչներ՝ 2004 թվականի ներդրումային ծրագրի շրջանակներում սկսված, սակայն անավարտ մնացած աշխատանքների նպատակով իրականացված ներդրումներ և ներդրումներ, որոնք ներառված չեն եղել ընկերության 2004 կամ 2005 թվականների ներդրումային ծրագրերում:

Փաստացի կատարված ներդրումների վերաբերյալ հանձնաժողով ներկայացված փեղեկարվության համաձայն, ընկերությունը 2005 թվականին ներդրումային ծրագրի շրջանակներում իրականացրել է 8 089,0 մլն դրամի ներդրումներ և ևս 1 337,3 մլն դրամի աշխատանքներ մնացել են անավարտ: Իրականացված ներդրումների ծավալի բաշխումը ներդրումային ծրագրի ուղղությունների միջև ներկայացված է աղյուսակում:

N	Ներդրումային ծրագրի ուղղությունը, ենթաուղղությունը	Հանձնաժողովի հետ համաձայնեցված 2005 թվականի ներդրումների կանխատեսվող ծավալը		2005 թվականի ընթացքում փաստացի կատարված ներդրումների ծավալը		Տվյալ ուղղության կատարման ցուցանիշը
		մլն դրամ	%	մլն դրամ	%	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Աբովյանի գազի ստորգետնյա պահեստարան-կայանի վերակառուցում	2 053,4	23,7	5,6	0,1	0,3
1	Գազափոխադրման համակարգի վերակառուցում և վերազինում	284,7	3,3	173,7	2,1	61,0
2	Գազափոխադրման համակարգում կորուստների նվազեցում	43,5	0,5	0,0	0,0	0,0
3	Գազափոխադրման համակարգում ներդրումներ այլ ուղղություններով	273,2	3,1	33,2	0,4	12,1
4	Գազաբաշխման համակարգի ընդլայնում և նոր բաժանորդների միացում	4 837,7	55,8	6 484,1	80,2	134,0
4.1	գազաբաշխման համակարգի ընդլայնում	1 837,7	21,2	3 911,2	48,4	212,8
4.2	նոր բաժանորդների միացում	3 000,0	34,6	2 572,9	31,8	85,8
5	Գազաբաշխման համակարգի վերակառուցում և վերազինում	588,8	6,8	877,1	10,8	149,0
6	Գազաբաշխման համակարգում կորուստների նվազեցում	131,4	1,5	145,9	1,8	111,0
7	Գազաբաշխման համակարգում ներդրումներ այլ ուղղություններով	460,5	5,3	369,4	4,6	80,2
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>		<b>8 673,2</b>	<b>100,0</b>	<b>8 089,0</b>	<b>100,0</b>	<b>93,3</b>

**«ՆայՌուսգագարդ» ՓԲԸ 2005 թվականի ներդրումային գործունեության համապարփակ գնահատականը**

Այսպիսով, ամփոփելով «ՆայՌուսգագարդ» ՓԲԸ-ի 2005 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքները պետք է փաստել՝

1. ընկերությունը 2005 թվականի ընթացքում ներդրումային ծրագրի շրջանակներում իրականացրել է 8 089,0 մլն դրամի ներդրումներ՝ նախատեսված 8 673,2 մլն դրամի փոխարեն,
2. գազաբաշխման համակարգի ընդլայնման և նոր բաժանորդների միացման նպատակով 4 837,7 մլն դրամի ներդրումների փոխարեն ընկերությունն իրականացրել է 6 484,1 մլն դրամի ներդրումներ, որի արդյունքում 2005 թվականի ավարտին գազի բաշխման ցանցին միանալու հնարավորություն ունեցող բնակիչների թիվը կազմել է 532 000 և դրանցից 360 000-ն արդեն միացված են եղել գազի բաշխման ցանցին հանդիսանալով բաժանորդներ: Մինևույն ժամանակ նախատեսված 619,1 կմ գազափարների փոխարեն կառուցվել են 668,3 կմ գազափարներ,
3. ընդհանրապես ներդրումներ չեն կատարվել գազափոխադրման համակարգում կորուստների նվազեցման ուղղությամբ: Բավական ցածր է նաև Աբովյանի գազի ստորգետնյա պահեստարան-կայանի և գազափոխադրման համակարգում այլ ուղղություններով իրականացված ներդրումների ծավալը:
4. ընկերության 2005 թվականի ներդրումային ծրագիրը կատարվել է 93,3%-ով, իսկ ներդրումային ծրագրի հիմնական գերակա ուղղությունը՝ գազաբաշխման համակարգի ընդլայնման և նոր բաժանորդների միացման նպատակով նախատեսված ներդրումները՝ 134,0%-ով:

**Նաշվի առնելով վերը նշվածը, պետք է եզրակացնել, որ «ՆայՌուսգագարդ» ՓԲԸ-ի 2005 թվականի ներդրումային ծրագիրը հիմնականում կատարվել է: Չնայած այն հանգամանքին, որ առկա են եղել նաև ուղղություններ որոնցով ներդրումներ չեն իրականացվել կամ կատարման ցուցանիշը բավական ցածր է եղել, ներդրումային ծրագրի հիմնական գերակա ուղղությունը կատարվել է 134,0%-ով:**

.....  
**ԱՎԱՐՏ**
